Plano de comunicação e gerenciamento de risco

Grupo - NanaSmart
102610 - André Henrique Valério
117509 – Geovana Miuky Ogawa
117322 – João Rafael Lombi de Jesus
117260 – Nádia Nayara Dias Coelho
115534 – Nicolas Francesco de Oliveira
114587 – Victor Henrique Bruno


Este documento apresenta os artefatos de gerenciamento de riscos e comunicação do projeto. As tabelas foram organizadas com base nos riscos já identificados no plano de integração do projeto, complementados pelo risco relacionado à dependência da API Gemini, e nas práticas de comunicação adotadas pela equipe.

1. Matriz de Riscos

A matriz apresenta os riscos que podem afetar o desenvolvimento do NanaSmart, considerando sua probabilidade de ocorrência e o impacto sobre o projeto. O nível de risco é calculado pela multiplicação entre probabilidade e impacto.

Escala de classificação: Probabilidade e Impacto: 1 – Baixa; 2 – Média; 3 – Alta.

ID	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Nível
R01	Falhas de integração entre front-end, API e banco de dados.	3 – Alta	3 – Alto	9 – Alto
R02	Mudanças ou inconsistências nos requisitos durante o desenvolvimento.	2 – Média	3 – Alto	6 – Médio
R03	Identificação tardia de erros, ocasionando retrabalho.	2 – Média	3 – Alto	6 – Médio
R04	Atrasos nas atividades e entregas do projeto.	2 – Média	3 – Alto	6 – Médio
R05	Indisponibilidade temporária de algum integrante da equipe.	2 – Média	2 – Médio	4 – Médio
R06	Indisponibilidade ou falhas na integração com a API Gemini.	2 – Média	2 – Médio	4 – Médio

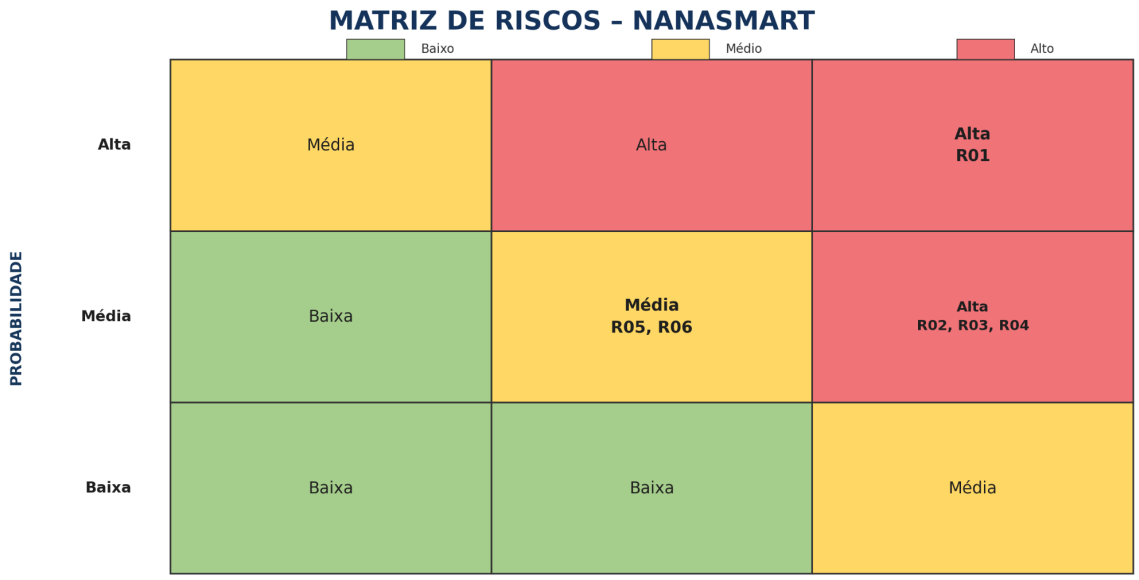

2. Plano de Resposta aos Riscos

O plano de resposta define as estratégias e ações que serão adotadas para reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos ou minimizar seus impactos.

ID	Estratégia	Ações preventivas ou corretivas	Responsável
R01	Reduzir	Definir contratos de API, utilizar branches curtas e realizar testes de integração entre front-end, API e banco de dados.	André, Victor e Nádia
R02	Reduzir	Manter os requisitos documentados, utilizar rastreabilidade e solicitar o aceite da Product Owner para alterações.	Geovana
R03	Reduzir	Realizar revisões frequentes do código, testes durante o desenvolvimento e demonstrações incrementais.	João e equipe
R04	Reduzir	Acompanhar semanalmente o cronograma, atualizar o GitHub Projects e repriorizar o backlog quando necessário.	Geovana e João
R05	Reduzir	Manter a documentação atualizada, compartilhar conhecimentos e redistribuir tarefas entre os integrantes.	Geovana e equipe

3. Matriz 5W2H

A matriz 5W2H detalha uma ação de resposta ao risco prioritário R01, organizando sua execução por meio de sete perguntas: o quê, por quê, onde, quando, quem, como e quanto.

Elemento	Aplicação no NanaSmart
What (O quê?)	Realizar testes de integração entre front-end, API e banco de dados.
Why (Por quê?)	Evitar falhas de comunicação entre os componentes e garantir o funcionamento dos principais fluxos do sistema.
Where (Onde?)	No ambiente de desenvolvimento do NanaSmart, utilizando GitHub e Postman.
When (Quando?)	Durante o desenvolvimento e na etapa de integração, antes da entrega final.
Who (Quem?)	André (Back-end), Victor (Front-end), Nádia (Banco de Dados) e João (QA).
How (Como?)	Por meio de testes das rotas da API, verificação da persistência dos dados e execução dos principais fluxos do sistema.
How Much (Quanto custa?)	Sem custo financeiro adicional previsto, utilizando as ferramentas já adotadas pela equipe.

4. Plano de Comunicação

O plano de comunicação estabelece como as informações do projeto serão compartilhadas entre a equipe e as demais partes interessadas, indicando o objetivo, os responsáveis, os destinatários, os canais utilizados e a frequência das comunicações.

Comunicação	Objetivo	Responsável	Destinatários	Canal	Frequência
Alinhamento interno	Compartilhar o andamento das atividades e identificar dificuldades.	João – Scrum Master	Equipe	WhatsApp / reuniões	Semanal
Atualização das tarefas	Acompanhar as atividades e entregas.	João – Scrum Master	Equipe	GitHub Projects	Semanal
Comunicação de impedimentos	Informar dificuldades que possam afetar o projeto.	Integrante responsável	Equipe e João	WhatsApp	Quando necessário
Validação com o cliente	Apresentar funcionalidades e obter feedback.	Geovana – PO	Mateus Farias	Reuniões presenciais ou on-line	Conforme necessidade
Orientação acadêmica	Esclarecer dúvidas e apresentar o andamento das entregas.	Equipe	Prof. Camilo	Reuniões / aulas	Conforme cronograma acadêmico
Registro de decisões	Documentar decisões relevantes para o projeto.	João – Scrum Master	Equipe	Documentação oficial	Quando necessário
Comunicação de falhas técnicas	Informar problemas de integração, banco de dados ou API.	Integrante que identificar o problema	Integrantes envolvidos e João	WhatsApp / GitHub Projects	Quando necessário
